

1.

PA Poběžovice u Holic - kvn, DTS, knn - výkopové práce




Vypracoval - Jakub Schindler, 724 330 693



- přechodné DZ pro tuto stavbu bude stanoveno dle schéma OD 210 a OD 230, doplněné o značení z tohoto schéma.
- veškeré výkopy budou řádně označeny a zabezpečeny s ohledem na bezpečnost chodců a dopravy.
- rezidentům bude umožněn přístup k nemovitostem - pochozí lávka. V případně technických možností bude zajištěn i příjezd.
- u čp. 16 budou dva překopy vozovky, řešeno překopy po 1/2, aby byl zachován průjezd. Průjezd točnou bude umožněn, v případě jeho neproveditelnosti, bude nalezeno nové řešení v průběhu realizace.
- stavba bude realizována po cca 250m úsecích s ohledem na povětrnostní podmínky během zimního období.

Termín realizace: 3. 2. - 30. 6. 2025


Uzavírka od čp. 18 k čp. 17: 1. 4. - 15. 4. 2025

LEGENDA:

-  výkop NN, šířka 0,5 m
-  výkop VN, šířka 0,8 m
-  protlak pod vozovkou
-  pojezdová deska

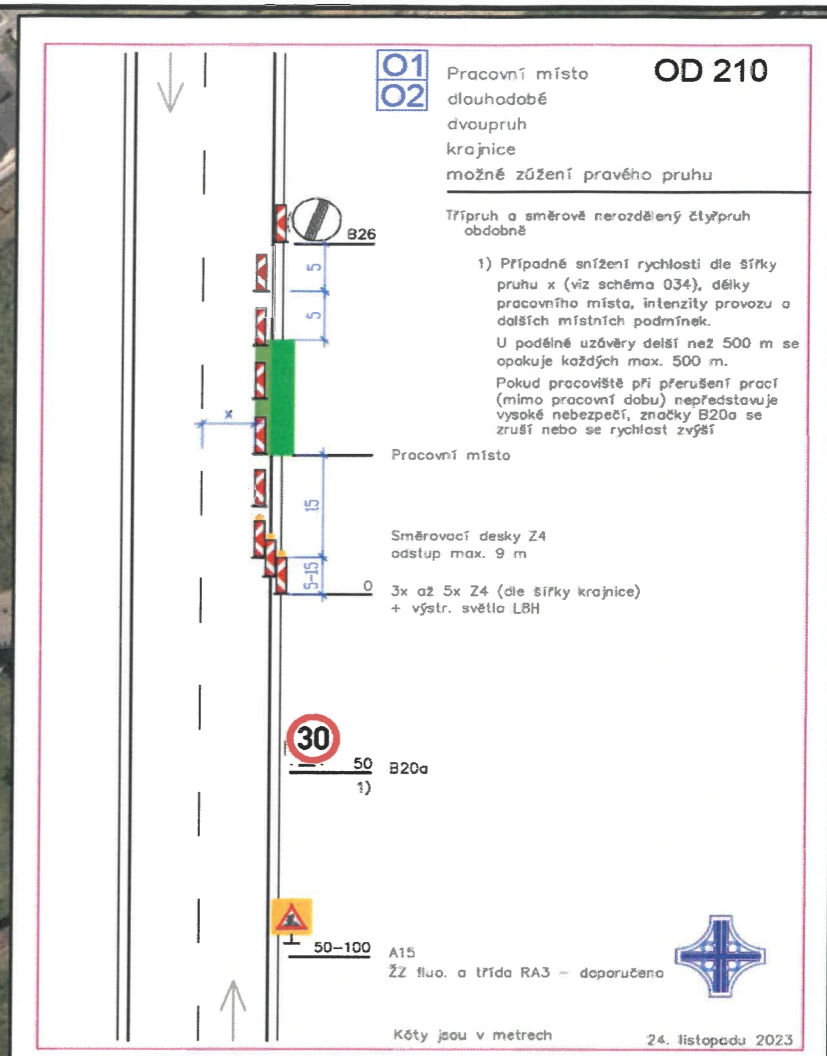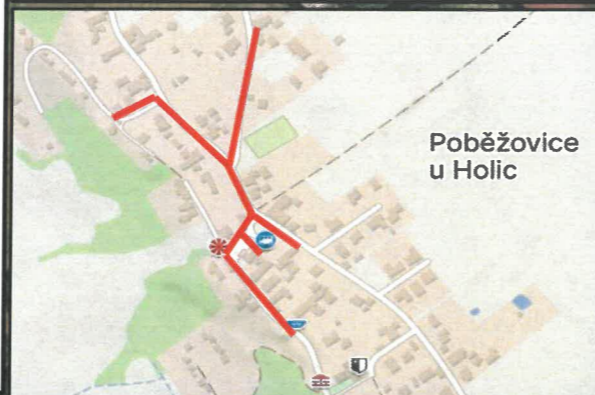

Dopravní značení (zetka) budou umístěna max. 0,5 od obruby

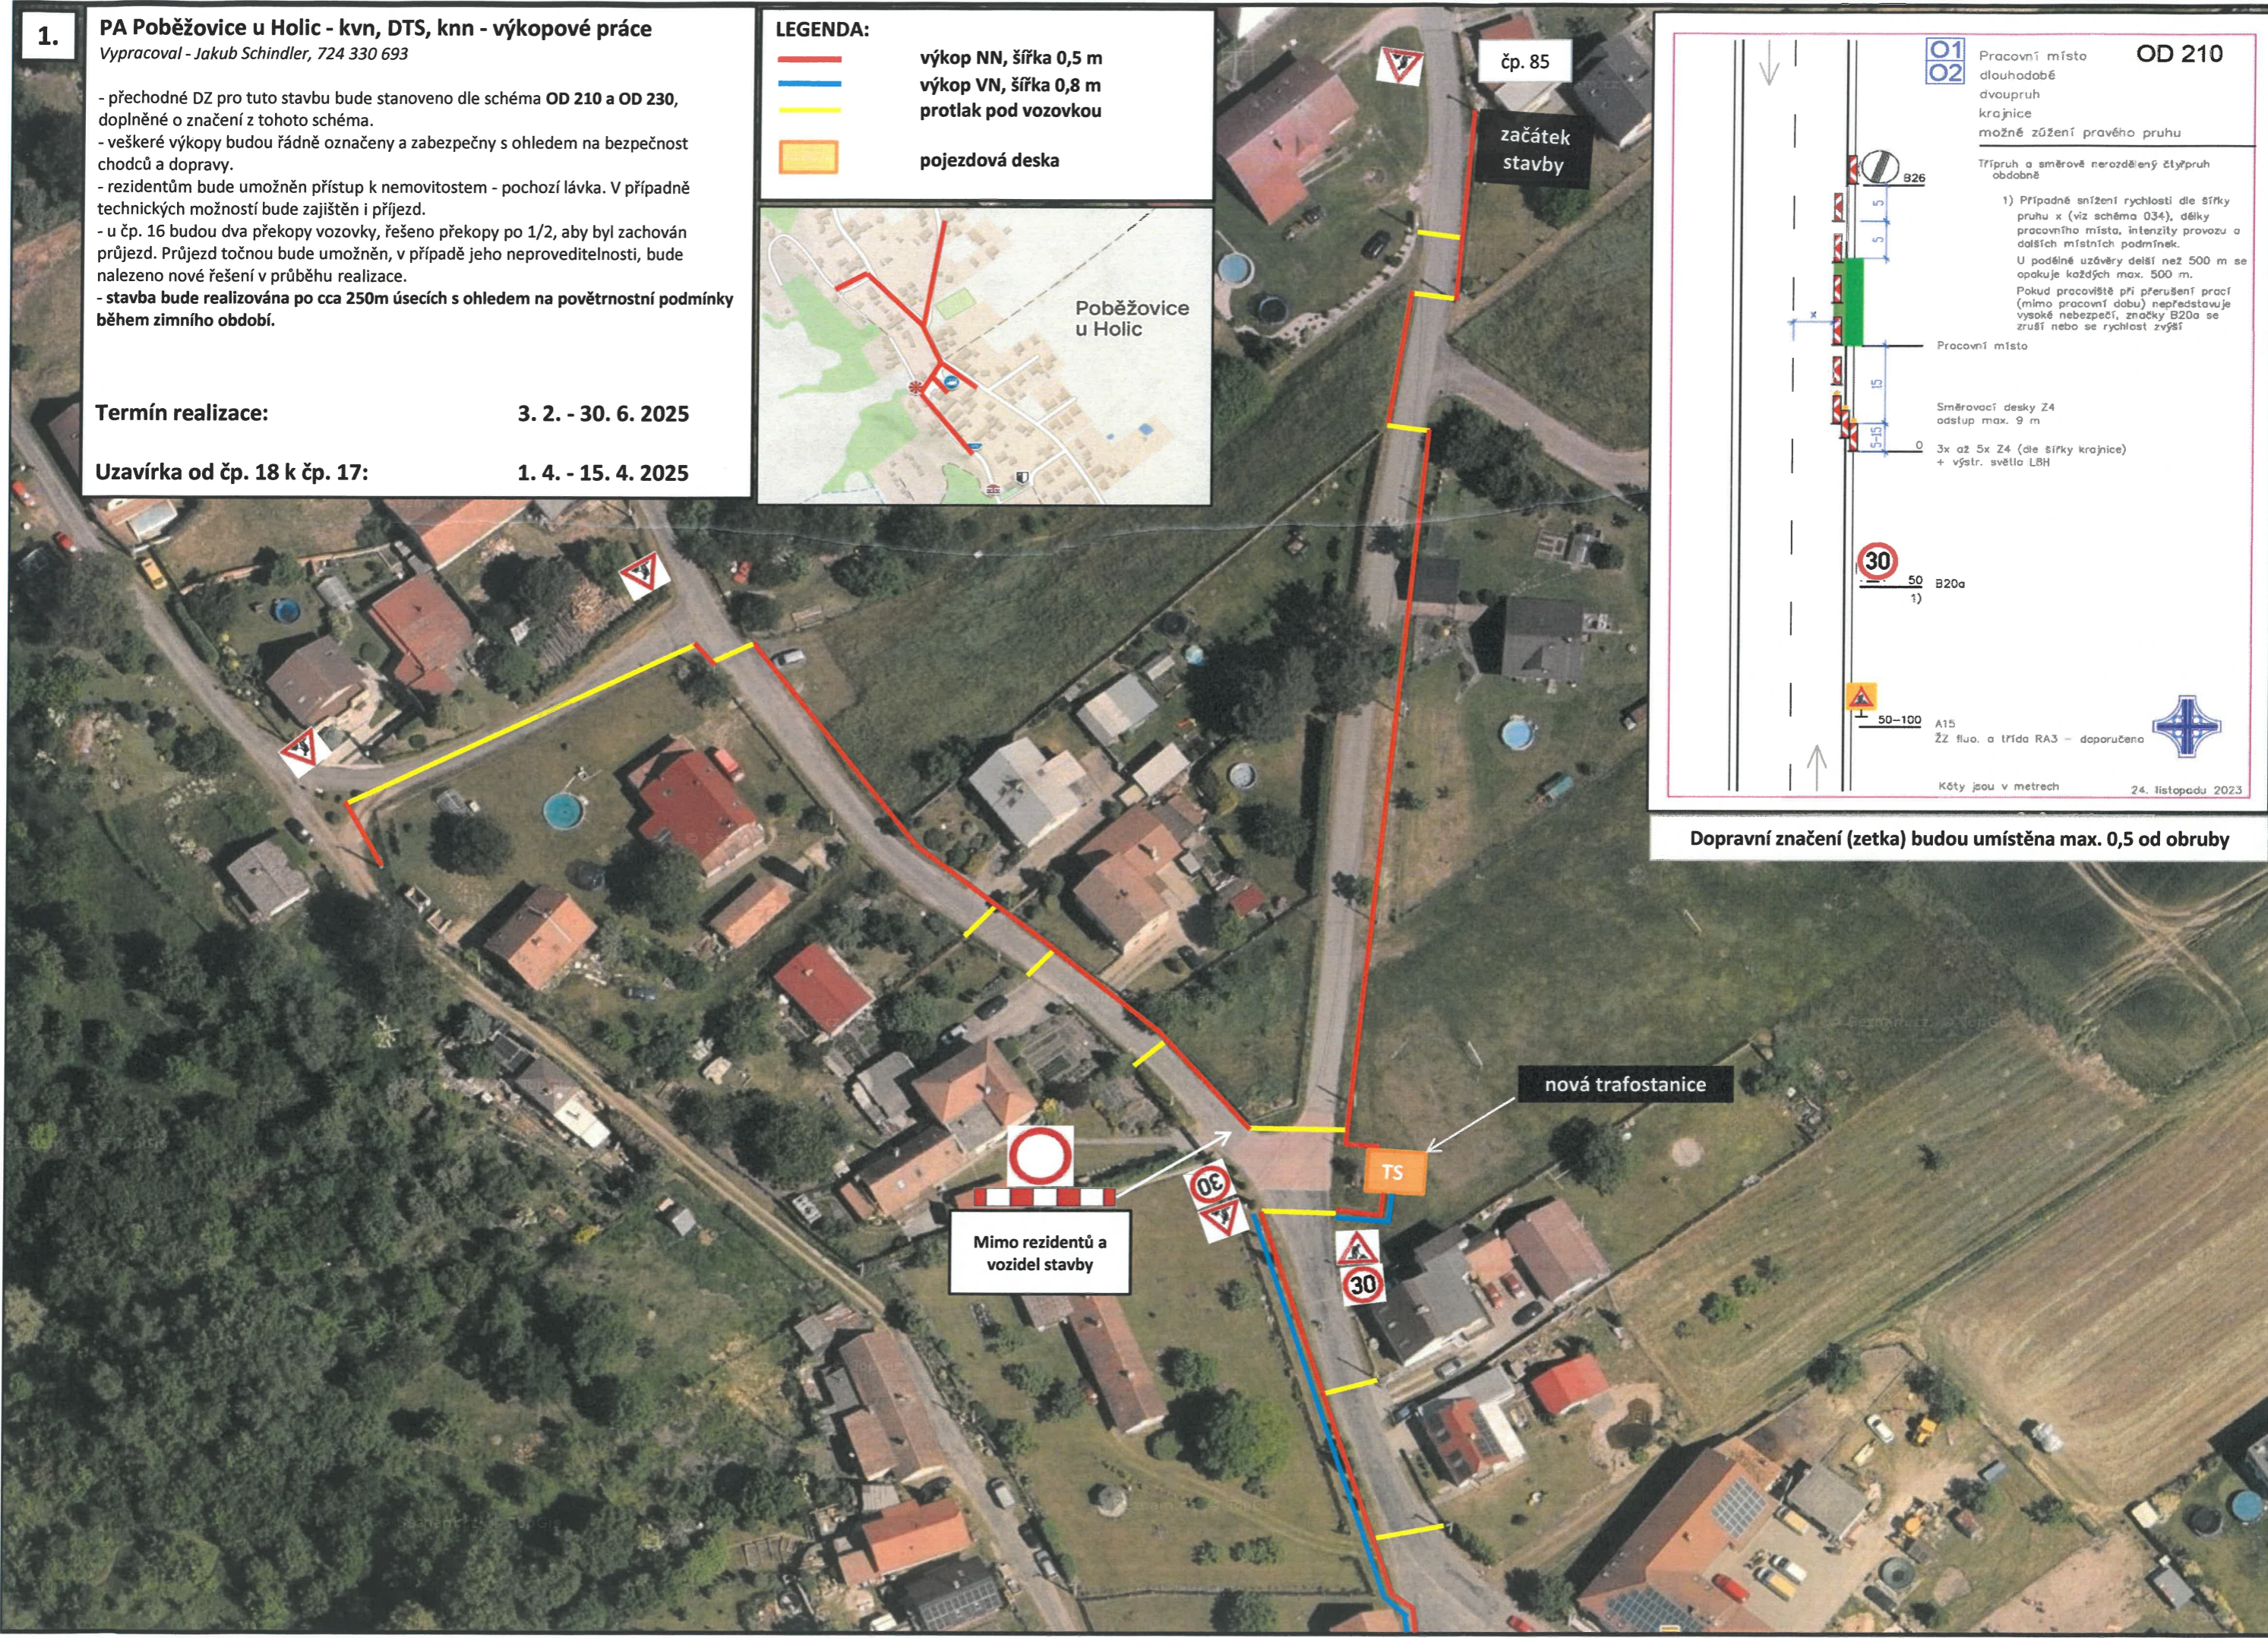

2.

Pojezdová deska kvůli zachování průjezdnosti točny. Výkop bude proveden mimo pracovní dny

přesunutá zastávka po dobu výk. prací

přechodně zrušená zastávka

čp. 16

čp. 17

3.

Poběžovice u Holic

450 m

Depónie

Obecní úřad čp. 18

OD 230 bude použito při překopu vozovky po 1/2 u čp. 16. Dále pak na vozovce, kde bude stát mechanizace v jízdním pruhu.

